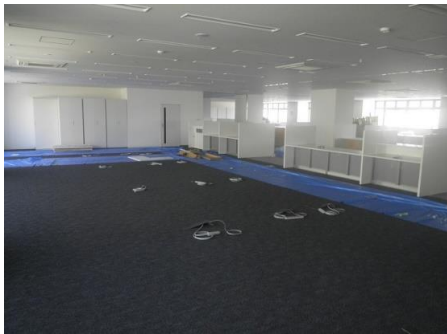
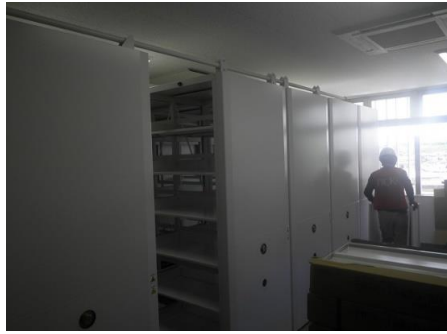


新庁舎等建設Ⅰ期工事の進捗状況（令和4年5月-1）

年	月日	建設予定地（東側）（庁舎棟）	建設予定地（西側）（附属棟）
2022年	5月2日	庁舎棟・附属棟ともに、床の仕上げ工事が終了した階からカウンター等の家具工事を行い、各スペース等のサイン工事を行う予定にしています。 その後、終了した階より試運転調整、美装、環境測定を行うように予定しています。 また、外部工事に工事についても、着々と進んでおり、階段やフェンスなどが出来上がっています。	
		2F 執務室 	附属棟 屋外スペース屋根 
		4F 書庫 	北側外観 
		4F 倉庫 	南側外構 
