


■建設スケジュール

本事業は、市町村役場機能緊急保全事業を活用するため、平成32年度中に新庁舎完成をする必要があります。そのため、基本計画の策定後、設計者の選定を進め、平成31年度中の工事着手を目指し、平成32年度3月の新庁舎完成を目指します。

基本計画の検討段階において、低層・高層・分棟の各整備手法ごとに建設スケジュールを検討しました。

各整備手法の工期は、下記のように考えられます。




工事ステップイメージ

【低層案】

- 既存庁舎解体後、ホール建設を行うため、他の案に比べ工期が長くなる。

▼工事ステップイメージ

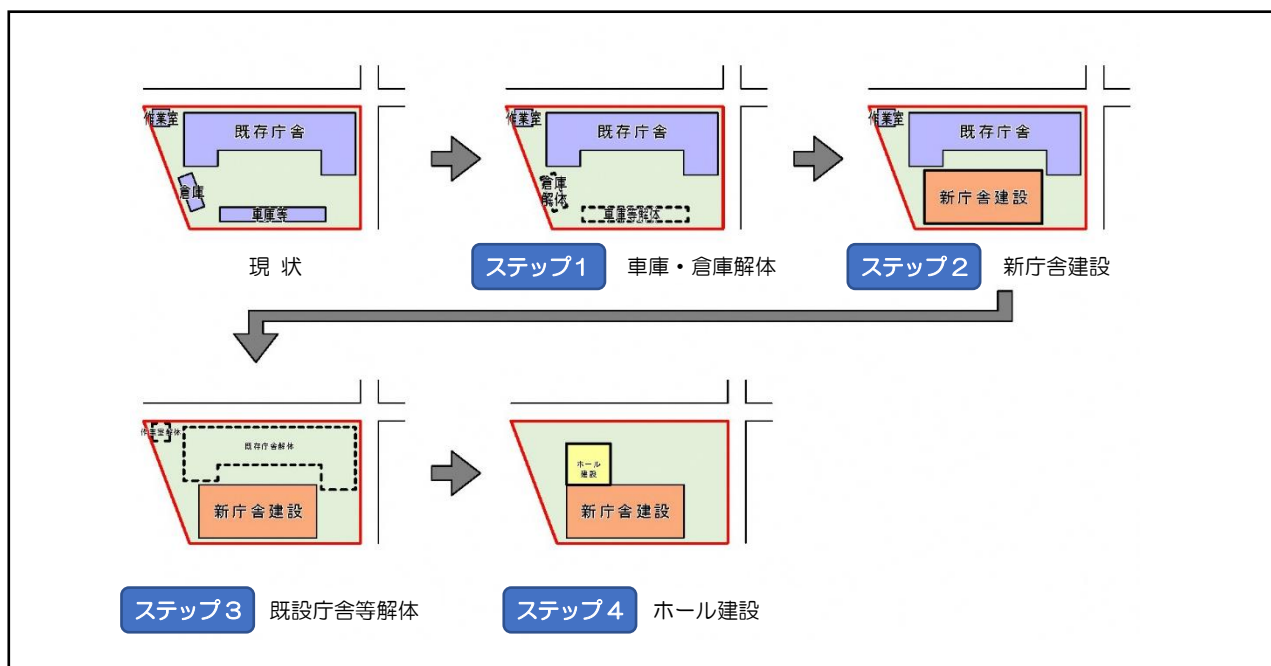


▼整備スケジュール

	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
施工者選定までのスケジュール		基本計画 (12か月) 基本設計 実施設計 設計者の選定 (1か月)				
庁舎建設				(18か月) 建設工事等	新庁舎供用開始 (9か月) 解体、外構工事等必要な整備	新庁舎全面完成
ホール建設					解体開始 (9か月) 建設工事等	

【高層案】

- 高層案は新庁舎建設と同時に施工が行えるため、低層案に比べ工期短縮が可能となる。
- 建設工期が長くなる為、設計工期を短縮する必要があります。

▼工事ステップイメージ

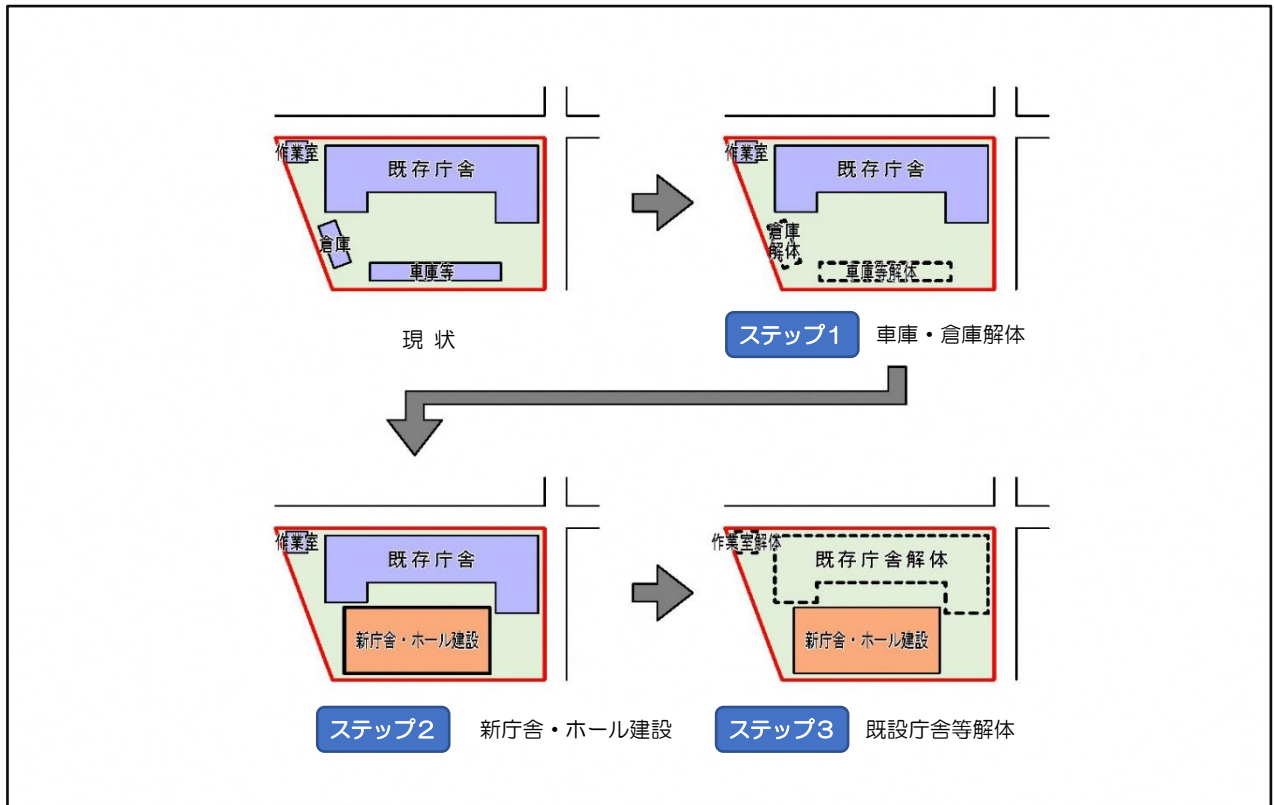

▼整備スケジュール


	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
施工者選定までのスケジュール		基本計画 (10か月) 基本設計 実施設計 設計者の選定 (1か月)				
庁舎・ホール建設			(20か月) 建設工事等		新庁舎供用開始 (9か月) 解体、外構工事等 必要な整備	新庁舎全面完成

平成32年度中に新庁舎完成

【分棟案】

- 分棟案は、武徳館の敷地にホールを建設することで新庁舎建設と同時に施工が行えるため、低・高層案に比べ工期短縮が可能となる。

▼工事ステップイメージ

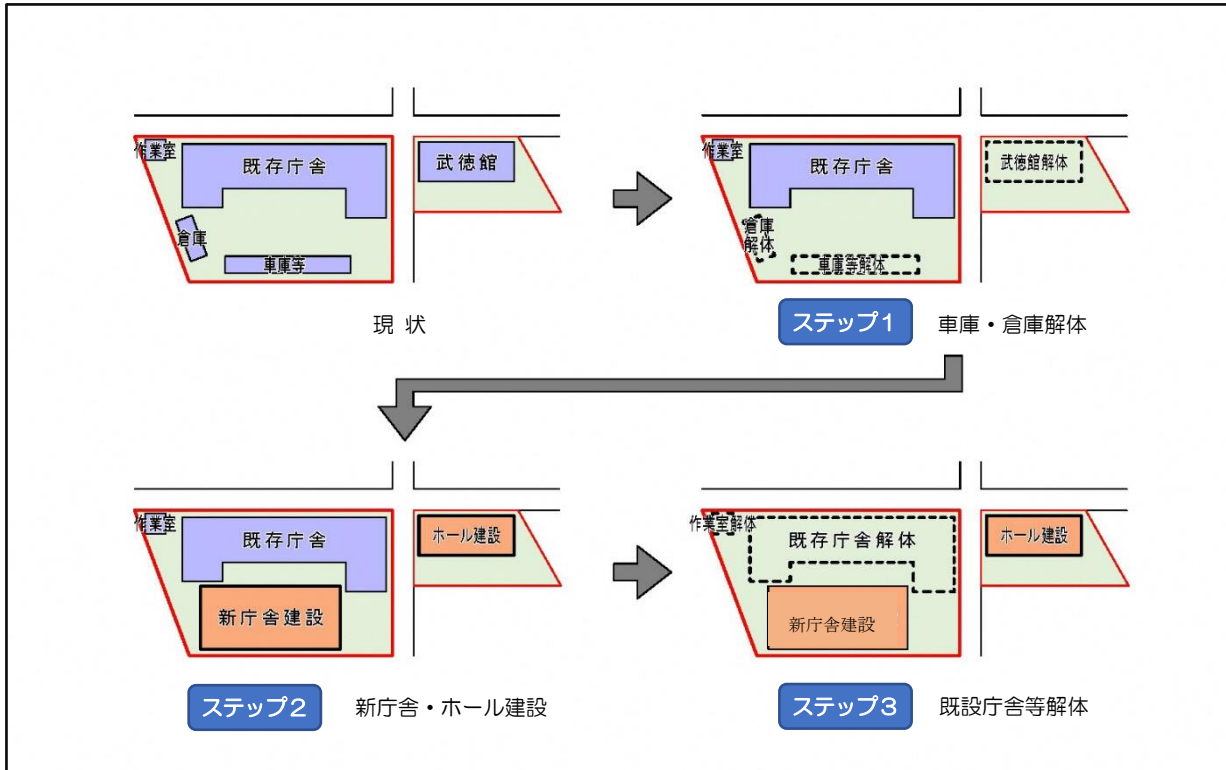

▼整備スケジュール

	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
施工者選定までのスケジュール		基本計画 (12か月) 基本設計 実施設計 設計者の選定 (1か月)				
庁舎建設				(18か月) 建設工事等	新庁舎供用開始 (9か月) 解体、外構工事等 必要な整備	新庁舎全面完成
ホール建設			(3か月) 解体工事	(9か月) 建設工事等	ホール供用開始	
