## 別紙2－①　広川町新庁舎等建設の進捗状況一覧表（平成29年10月～令和4年5月31日）

| 発注準備中 | 契約段階 | 実施中 | 完了 | 区分 | 名称 | 契約年月日 | 完了(検査)年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ● | 委託 | 新庁舎基本計画策定委託 | H29.11.27 | H30.9.19 |
| | | | ● | 委託 | 執務環境等調査業務委託 | H30.2.15 | H30.8.15 |
| | | | ● | 委託 | 新庁舎等建設基本設計支援業務委託（1） | H31.2.14 | H31.3.29 |
| | | | ● | 委託 | 新庁舎等建設基本設計支援業務委託（2） | H31.4.1 | R1.8.30 |
| | | | ● | 委託 | 現庁舎等アスベスト含有建材抽出調査業務 | R1.8.8 | R1.9.27 |
| | | | ● | 委託 | 現庁舎等アスベスト含有建材抽出分析業務 | R1.10.31 | R1.12.26 |
| | | | ● | 委託 | 現庁舎既存井戸調査業務 | R1.12.12 | R2.1.17 |
| | | | ● | 委託 | 新庁舎建設に伴う井戸試掘調査業務 | R2.12.9 | R3.3.1 |
| | | | ● | 委託 | 建設発生土分析調査業務 | R2.12.21 | R3.3.5 |
| | | | ● | 委託 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託業務（1） | R2.11.24 | R3.2.14 |
| | | | ● | 委託 | PCB含有廃棄物収集運搬業務（1） | R2.11.24 | R3.1.8 |
| | | | ● | 委託 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託業務（2） | R3.1.29 | R3.3.15 |
| | | | ● | 委託 | PCB含有廃棄物収集運搬業務（2） | R3.1.29 | R3.2.24 |
| | | | ● | その他 | PCB処理推進協力金（北九州市） | R3.2.17 | R3.3.5 |
| | | | ● | 委託 | 庁舎附属建物及び武徳館解体等工事設計業務 | R1.12.23 | R2.4.22 |
| | | | ● | 委託 | 庁舎附属建物及び武徳館解体等工事監理業務 | R2.4.23 | R3.1.28 |
| | | | ● | 委託 | 本庁舎部分解体（玄関廻り）改修設計業務 | R2.1.6 | R2.4.22 |
| | | | ● | 委託 | 本庁舎部分解体（玄関廻り）改修監理業務 | R2.4.23 | R2.11.9 |
| | | | ● | 工事 | 新庁舎建設に伴う既存施設解体・改修工事 | R2.5.15 | R3.1.28 |
| | | | ● | 委託 | 新庁舎等建設・設計監理業務委託（Ⅰ期工事） | H31.1.23 | R4.5.31 |
| | | ○ | | 委託 | 執務環境等構築支援業務委託 | H31.1.30 | (R4.9.30) |
| | | | ● | 工事 | 新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築設備工事） | R2.12.17 | R4.5.31 |
| | | | ● | 工事 | 新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事） | R2.12.17 | R4.5.31 |

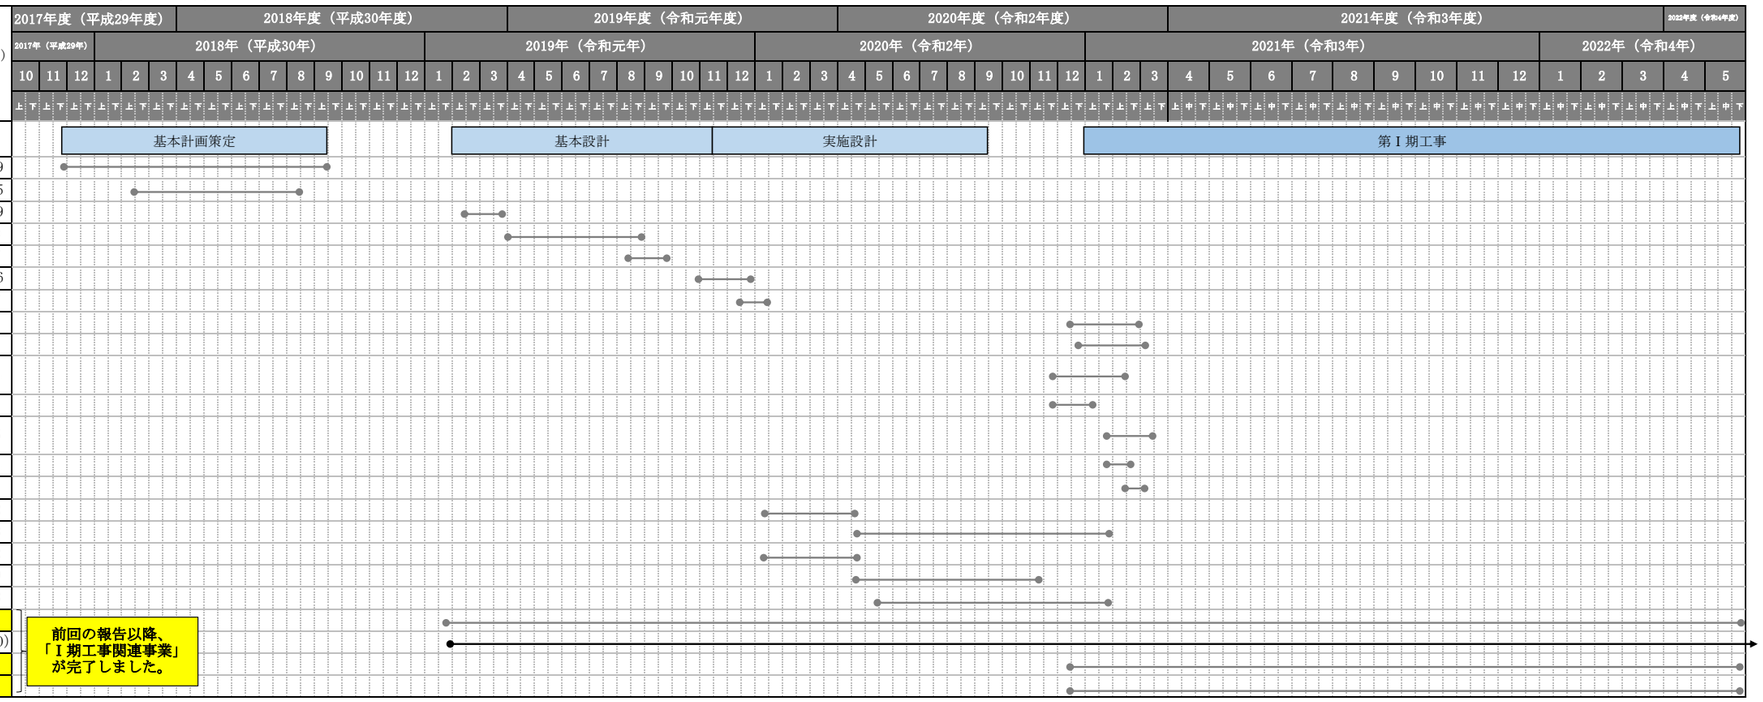


## 別紙2－②　広川町新庁舎等建設の進捗状況一覧表（令和4年6月1日以降）
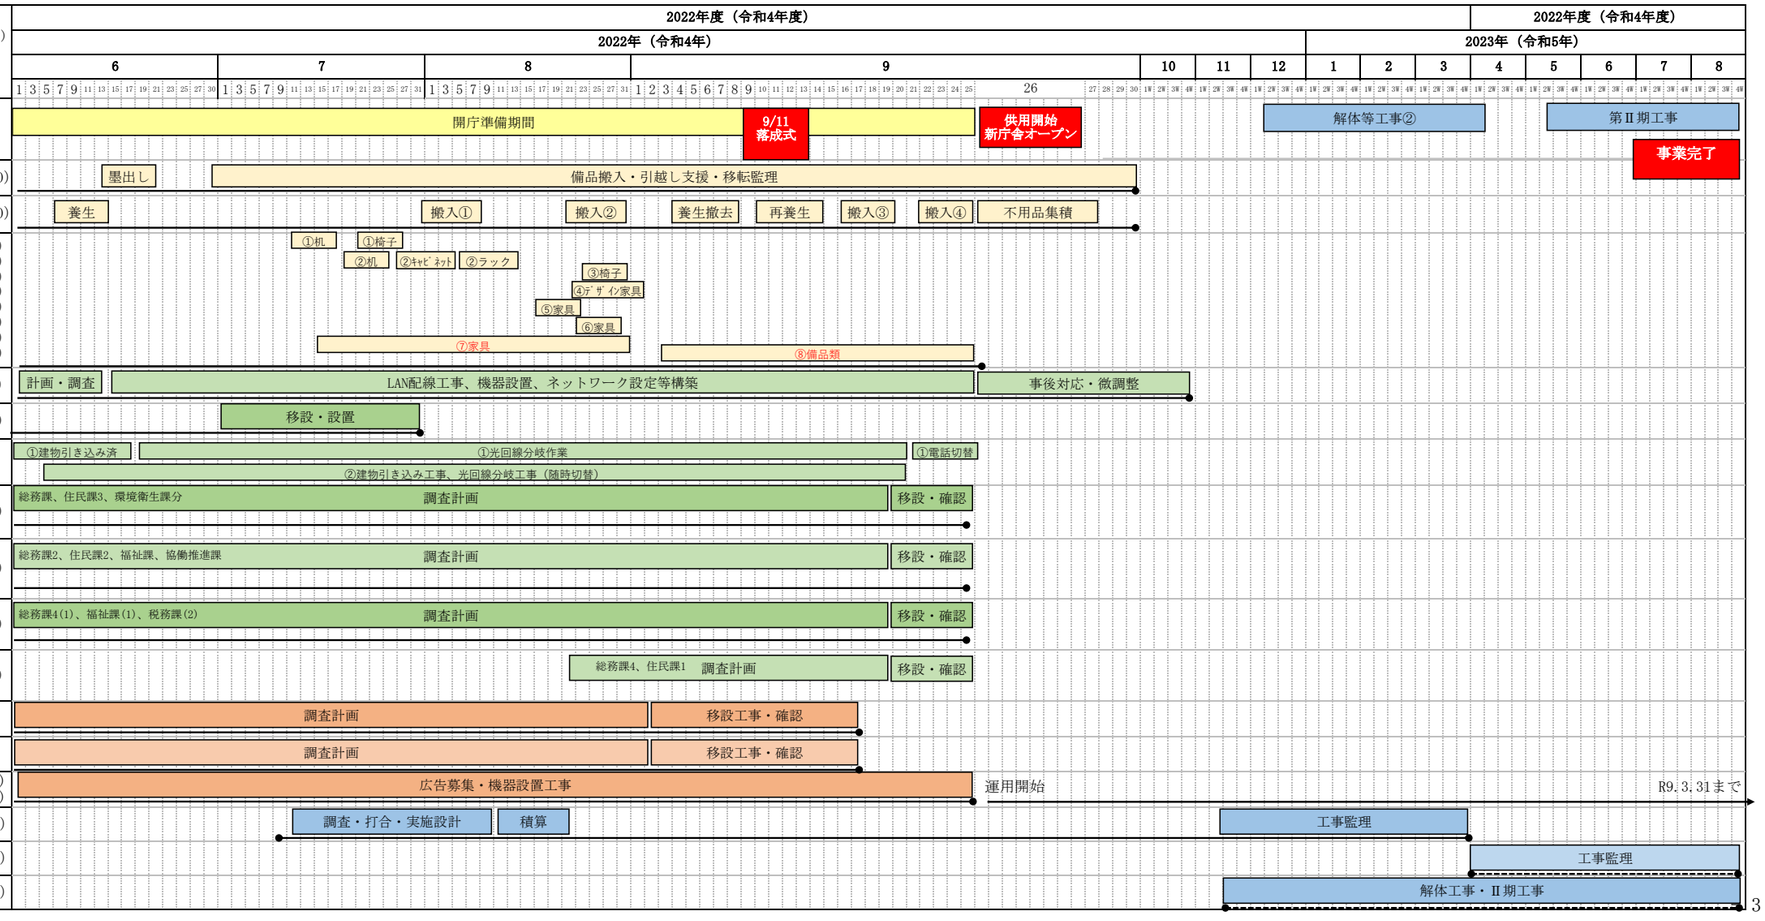
| 発注準備中 | 契約段階 | 実施中 | 完了 | 区分 | 名称 | 契約年月日 | 完了(検査)年月日(予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ | | 委託 | 執務環境等構築支援業務委託 | H31.1.30 | (R4.9.30) |
| | | ○ | | 委託 | 新庁舎移転業務 | R4.5.11 | (R4.9.30) |
| ⑧ | ⑦ | ①<br>②<br>③<br>④<br>⑤<br>⑥ | | 購入 | ①議場家具購入<br>②執務室家具購入（机・キャビネット）<br>③執務室家具購入（事務椅子）<br>④多目的スペース等家具購入<br>⑤町長室等家具購入事業<br>⑥会議室 倉庫 執務ｻﾎﾟｰﾄｴﾘｱ等家具購入<br>⑦（その他家具類）<br>⑧（家電等備品類） | R3.12.14<br>R4.3.23<br>R4.3.23<br>R4.4.27<br>R4.5.20<br>R4.5.25仮<br>(R4.6.**)<br>(R4.6.**) | (R4.7.29)<br>(R4.8.31)<br>(R4.8.31)<br>(R4.8.31)<br>(R4.8.31)<br>(R4.8.31)<br>(R4.8.**)<br>(R4.9.**) |
| | | ○ | | 委託<br>工事 | 新庁舎ネットワーク構築事業<br>（機器導入・LAN配線・NW構築事業） | R4.3.31 | (R4.10.31) |
| | | ○ | | 委託<br>工事 | 議場システム及び映像配信設備導入 | R3.1.6 | (R4.7.31) |
| ○ | | ○ | | 工事 | 電話回線引込工事（①NTT,②QTﾈｯﾄ） | | |
| ○ | | | | 委託 | 情報機器移設（NTT回線分）<br>町電話回線、住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ、県国保連合会ｼｽﾃﾑ、戸籍ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ、水道監視ｼｽﾃﾑ | | (R4.9.25) |
| ○ | | | | 委託<br>工事 | 情報機器移設（QT回線分）<br>FMCふくおか自治体ｸﾗｳﾄﾞ、住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ、総合行政ｼｽﾃﾑ、後期高齢者医療広域連合ｼｽﾃﾑ、県介護保険、県防災行政無線 | | (R4.9.25) |
| ○ | ○ | | | 委託 | 情報システム機器等移設<br>中間ｻｰﾊﾞ接続機器、番号関連用認証機器、（管理系ｻｰﾊﾞ）、統合ｻｰﾊﾞ（本体、子育支援、地図情報、税務支援）、SSG | | (R4.9.25) |
| ○ | ○ | | | 委託 | 情報機器類移設等<br>ｼｰﾄｶｯﾀｰ、複合議・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、印刷機、窓口発券機、ｺﾋﾟｰ機（ｺｲﾝ式用機器設置込） | | (R4.9.25) |
| ○ | | | | 委託<br>工事 | 防災行政無線、（県防災・行政情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ） | | |
| ○ | | | | 委託<br>工事 | 震度計移設事業 | | |
| | | ○ | | その他 | 広告付きデジタルサイネージ設置事業 | R4.2.22 | (R4.9.25)<br>(R9.3.31) |
| | | ○ | | 委託 | 現庁舎及び附属建物解体工事設計・監理業務 | R3.10.6 | (R5.3.24) |
| ○ | | | | 委託 | 新庁舎等建設Ⅱ期工事監理業務 | | (R5.8.**) |
| ○ | | | | 工事 | 新庁舎等建設Ⅱ期工事（現庁舎及び附属建物解体工事含む） | | (R5.8.**) |
