資料1－①　広川町新庁舎等建設の進捗状況一覧表（平成29年10月～令和3年3月31日）

進捗状況 発注準備中	契約段階	実施中	完了	区分	名称	契約年月日	完了(検査)年月日
			●	委託	新庁舎基本計画策定委託	H29.11.27	H30.9.19
			●	委託	執務環境等調査業務委託	H30.2.15	H30.8.15
			●	委託	新庁舎等建設基本設計支援業務委託（1）	H31.2.14	H31.3.29
			●	委託	新庁舎等建設基本設計支援業務委託（2）	H31.4.1	R1.8.30
			●	委託	現庁舎等アスベスト含有建材抽出調査業務	R1.8.8	R1.9.27
			●	委託	現庁舎等アスベスト含有建材抽出分析業務	R1.10.31	R1.12.26
			●	委託	現庁舎既存井戸調査業務	R1.12.12	R2.1.17
			●	委託	新庁舎建設に伴う井戸試掘調査業務	R2.12.9	R3.3.1
			●	委託	建設発生土分析調査業務	R2.12.21	R3.3.5
			●	委託	ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託業務（1）	R2.11.24	R3.2.14
			●	委託	PCB含有廃棄物収集運搬業務（1）	R2.11.24	R3.1.8
			●	委託	ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託業務（2）	R3.1.29	R3.3.15
			●	委託	PCB含有廃棄物収集運搬業務（2）	R3.1.29	R3.2.24
			●	その他	PCB処理推進協力金（北九州市）	R3.2.17	R3.3.5
			●	委託	庁舎附属建物及び武徳館解体等工事設計業務	R1.12.23	R2.4.22
			●	委託	庁舎附属建物及び武徳館解体等工事監理業務	R2.4.23	R3.1.28
			●	委託	本庁舎部分解体（玄関廻り）改修設計業務	R2.1.6	R2.4.22
			●	委託	本庁舎部分解体（玄関廻り）改修監理業務	R2.4.23	R2.11.9
			●	工事	新庁舎建設に伴う既存施設解体・改修工事	R2.5.15	R3.1.28
		○		委託	新庁舎等建設・設計監理業務委託（Ⅰ期工事）	H31.1.23	(R4.5.31)
		○		委託	執務環境等構築支援業務委託	H31.1.30	(R4.9.30)
		○		工事	新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築設備工事）	R2.12.17	(R4.5.31)
		○		工事	新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）	R2.12.17	(R4.5.31)

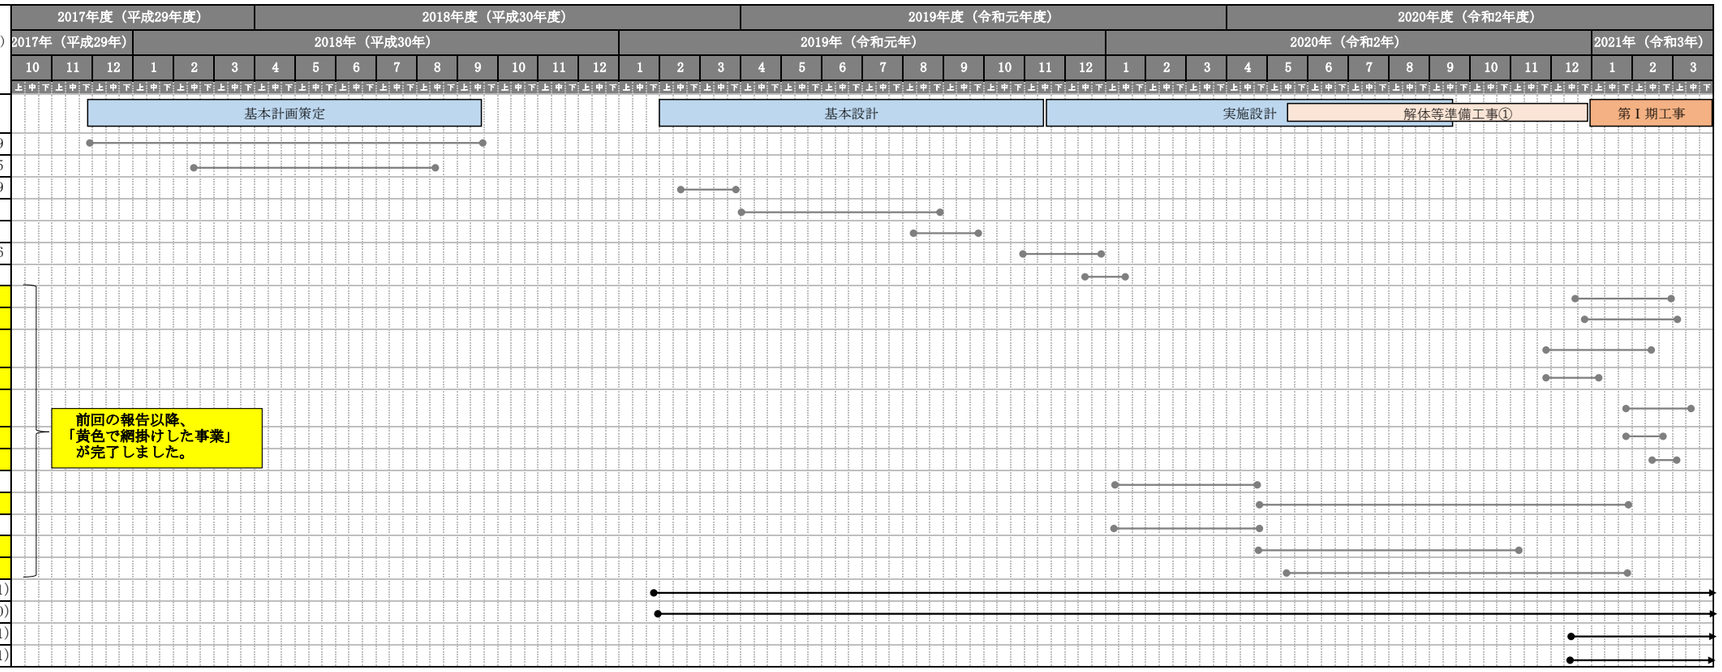

資料１－②　広川町新庁舎等建設の進捗状況一覧表（令和3年4月1日以降）
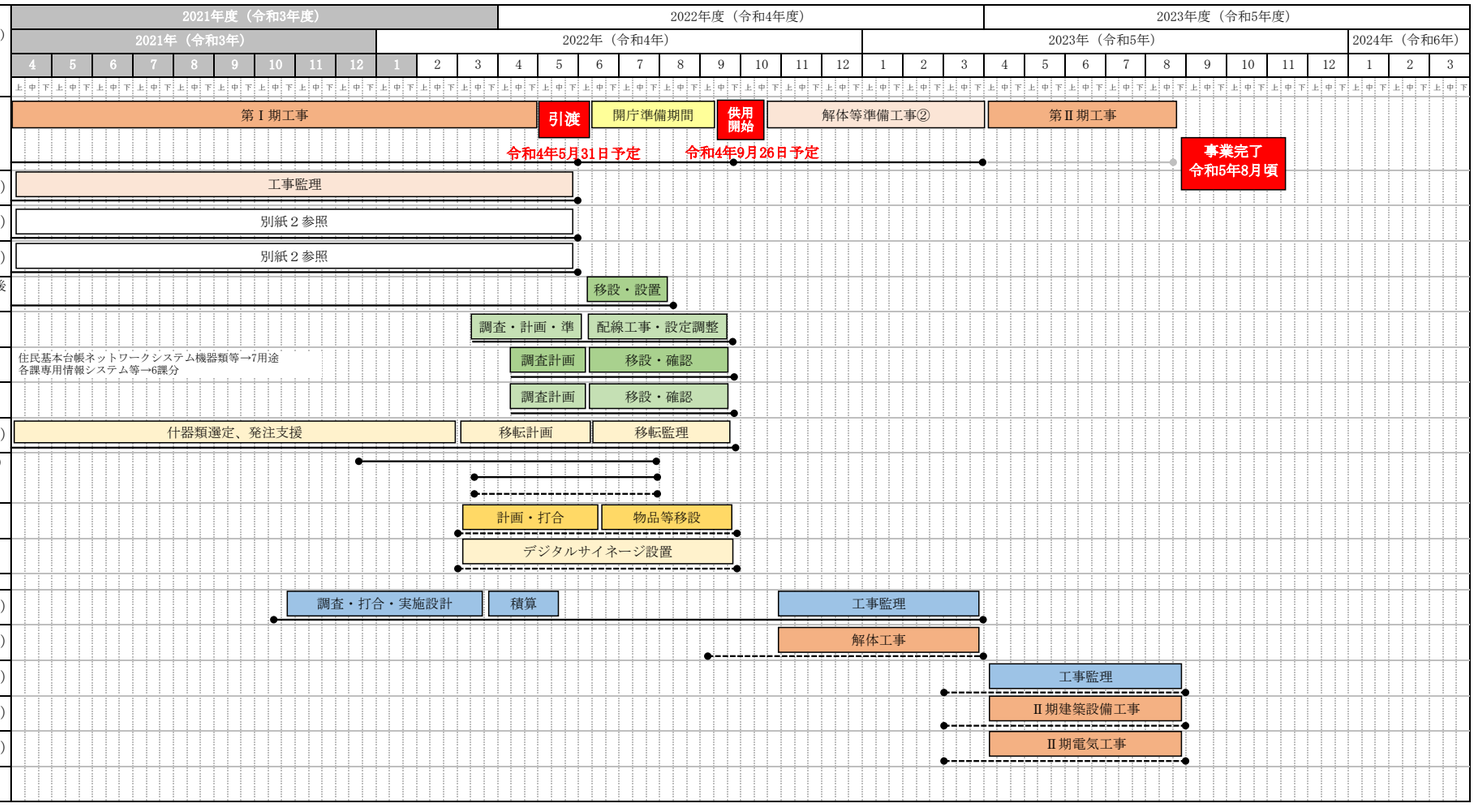
進捗状況 発注準備中	契約段階	実施中	完了	区分	名称	契約年月日	完了(検査)年月日(予定)
		○		委託	新庁舎等建設・設計監理業務委託（Ⅰ期工事）	H31.1.23	(R4.5.31)
		○		工事	新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築設備工事）	R2.12.17	(R4.5.31)
		○		工事	新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）	R2.12.17	(R4.5.31)
		○		委託工事	議場システム及び映像配信設備導入	R3.1.6	庁舎引渡後2ケ月後
○				委託工事	新庁舎ネットワーク構築事業（機器、LAN配線、設定調整等）		
				委託工事	各種情報処理機器移設調整、電話回線工事		
				委託工事	防災行政無線、県防災・行政情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ、震度計移設事業		
		○		委託	執務環境等構築支援業務委託	H31.1.30	(R4.9.30)
○	○	○		購入	新庁舎備品購入事業（議場家具購入） 〃　（執務室机・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、事務椅子） 〃　（その他）	R3.12.14	(R4.7.29)
○				委託	既存庁舎内文書物品引越し移設業務		
	○			その他	広告付きデジタルサイネージ設置事業		
		○		委託	現庁舎及び附属建物解体工事設計・監理業務	R3.10.6	(R5.3.24)
				工事	現庁舎及び附属建物解体工事		(R5.3.24)
				委託	新庁舎等建設Ⅱ期工事監理業務		(R5.8.31)
				工事	新庁舎等建設Ⅱ期工事（建築設備工事）		(R5.8.31)
				工事	新庁舎等建設Ⅱ期工事（電気工事）		(R5.8.31)
